



ACTA COMITÉ DIRECTIVO PAP - PDA No. 46

REUNION ORDINARIA

**PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP – PDA - ATLANTICO**

En Barranquilla, el día 9 de Febrero de 2019, en la Sala de Juntas “Luis Carlos Galán” de la Gobernación del Departamento del Atlántico se reunieron los miembros del Comité Directivo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. PAP – PDA – Atlántico.

CONVOCATORIA.

La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento del Atlántico mediante oficio de fecha 31 de Enero de 2019 convocó a los miembros del Comité Directivo a una reunión ordinaria a desarrollarse el día 9 de Febrero de 2019.

ORDEN DEL DIA PROPUESTO.

El orden del día propuesto y aprobado para la reunión fue el siguiente:

- 1- Llamado a lista y verificación de quórum
- 2 -Estado de Avance del PAP – PDA - Atlántico 2018
- 3- Presentación y aprobación recursos para el Plan de Gestión Social.
- 4- Presentación y aprobación recursos para el Plan de Aseguramiento.
- 5- Aprobación PAEI 2019.
- 6- Informe FIA.
- 7- Propositiones y varios.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Siendo las 9:30 AM, se instaló oficialmente la sesión No. 46 del Comité Directivo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. PAP – PDA – Atlántico

Se presento el orden del día con su modificación a los miembros del Comité Directivo, y se registró la siguiente asistencia:

- Dr. Eduardo Verano de la Rosa - Gobernador del Departamento del Atlántico
- Dr. Juan Pablo Serrano Castilla – Subdirector de Estructuración de Programa – Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
- Dra Beatriz Giraldo Castaño – Subdirectora de Agua y Saneamiento del DNP En Forma Virtual.
- Dr. Steimer Mantilla Rolong – Alcalde del Municipio de Puerto Colombia
- Dr. Javier Rodriguez Consuegra - Alcalde del Municipio de Candelaria
- Dra. Loretta Jiménez Sánchez – Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.

- A la presente reunión del Comité Directivo asistieron como invitados: Dra. Carolina Focazzio – Consultor del MVCT; Doctora. Nelcy Rivera Gerente Consorcio FIA, Nerly Patricia Pardo – Directora PDA Consorcio FIA; Dra. Nubia Merlano Velasquez, Secretaria de Ambiente de la Alcaldía de Puerto Colombia; Majana Sahili Asforgia Asesor de la CRA; Dr; Ramiro Osorio Mestrodomenico Gerente de ARCOS S.A. E.S.P; Dr; Juan Carlos Llinas Gerente de ARESUR; los funcionarios de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico: Katia Mercado, Genoveva Chams, Adalid Santiago, Edgar Plata Cuello.

Ernesto Barros, Fabián Jiménez y los Consultores Luis Correa Castro, Santiago Barros, Isis Brujes Ruiz.

Confirmada la asistencia de Seis (6) miembros del Comité Directivo, existe quórum suficiente para decidir.

Por disposición del numeral 6 del artículo 2.3.3.1.4.10. Del Decreto 1077 de 2015, la participación del Departamento Nacional de Planeación en los Comités Directivos únicamente se circunscribe a participar y votar cuando se vayan a discutir y aprobar los instrumentos de planeación. Por este motivo, conforme al Orden del Día propuesto, el DNP dará su voto donde se ponga a consideración, de forma integral, el Plan Anual Estratégico de Inversión 2019, El Plan de Gestión Social y de Aseguramiento 2019 y el Ajuste al PGEI 2016 – 2019.

2. ESTADO DE AVANCE DEL PAP PDA ATLANTICO:

La Doctora Loretta Jiménez presentó a los miembros del Comité el Estado de Avance del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Se presentó El Plan General Estratégico de inversión 2016 – 2019 modificado el cual asciende a la suma de \$ 325.668 millones, representado en recursos del SGP Departamento, Recursos propios y OCAD, Nación, Operadores y Corporación Regional Autónoma, este fue aprobado por los miembros del comité.

Se muestran en el Siguiete Cuadro:

PLAN GENERAL DE INVERSION 2016 – 2019

SECTOR DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO

FUENTE	MONTO en millones de \$
SGP – APSB (Departamento)	75.596
RECURSOS PROPIOS + OCAD	56.535
MVCT - NACION	82.758
MVCT - RURAL	12.600
OPERADORES	36.000
FONDO DE ADAPTACION	11.123
CORPORACIÓN REG AUTONOMA	51.056
TOTAL	325.668

Dentro del plan de Desarrolla se encuentran establecidas las siguientes Metas para la vigencia 2016-2019 en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

**METAS PLAN DE DESARROLLO
2016 - 2019**

METAS DEL PLAN DE DESARROLLO				
ITEM	LINEA BASE	META A 2019	META ALCANZADA	IMPACTO
ACUEDUCTO URBANO	98.86%	99.4%	99.2%	COBERTURA
ACUEDUCTO – RURAL nucleado	94.60%	98.00%	95.00%	COBERTURA
ALCANTARILLADO URBANO	83.80%	89.00%	84.55%	COBERTURA
ALCANTARILLADO - TRATAMIENTO	33.0%	37.00%	33.4%	TRATAMIENTO
ALCANTARILLADO – RURAL nucleado	0%	20%	11%	COBERTURA
INTRADOMICILIARIAS	0	2.000	709	SANEAMIENTO
ASEO - URBANO	97%	98%	97%	COBERTURA

El Doctor Santiago Barros hizo una descripción de los siguientes acueductos regionales en el atlántico, 1- Sabanagrande – Santo Tomas – Palmar de Varela con captación en Sabanagrande, 2- Baranoa – Polonuevo, 3- Ponedera Sabanalarga captación en ponedera captación de 200 lt/seg y ampliando a 400lt/seg y cubre a los corregimientos de martillo Santa Rita y la Retirada y Cascajal. y con la ampliación de la planta se pretende llevar el servicio a los corregimientos de Sabanalarga; y en el sur se encuentra el regional 4- Manati – Candelaria con captación en el canal del dique, beneficia a Carreto y leña; 5- Luruaco que es un regional de la cabecera con todos los corregimientos; el 6- costero que va de Barranquilla a Tubara - Juan de Acosta Piojo y Usiacuri se abastece del tanque de las delicias en Barranquilla; y desde barraquilla se atiende Galapa, Soledad parte de puerto Colombia.

A continuación se presentó el estado de los proyectos que ejecuta o ejecutó la Nación en la vigencia por un valor de \$ 49.096 millones.

➤ **CONSTRUCCIÓN ESTACION DE REBOMBEO II, ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO:**

Contrató: FINDETER

Valor: \$ 5.626 millones

Alcance: Construcción de un Tanque de almacenamiento de 3.000 m3 y Una (1) Estación de Rebombeco.

Familias beneficiadas: 1.055

Estado: Terminado.

Monto incluye 1.525 millones con fuente de recursos SGP Dpto (sistema general de participaciones Dpto

➤ **CONSTRUCCIÓN EBAR Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE SALGAR.**

Contrató: FONADE

Valor: 11.643 millones

Impacto: Pasa de una cobertura del 0 al 100%.

Familias beneficiadas: 840

Estado: Obra en operación y entregado al operador, faltan reparación viviendas.

El Departamento aportó \$ 1.430 millones con recursos del SGP Departamento.

➤ **CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO BARRIO MESOLANDIA.**

Contrató: FINDETER

Valor: 1.620 millones

Alcance: Instalación de 685 ml de tubería, se normaliza el sistema

Familias beneficiadas: 1.412

Estado: Terminado.

➤ **CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO.**

Contrata: FINDETER

Valor: 20.776 millones

Alcance: Construcción de 2 módulos de 120 lps cada uno (UASB y lagunas)

Impacto: Saneamiento Ciénaga de Malambo

Familias beneficiadas: 17.200

Estado: En ejecución 73% de Avance

El Departamento aportó \$ 1.770 millones con recursos del SGP Departamento

➤ **CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANIZACIÓN MUNDO FELIZ Y BARRIO PETRONITAS – SEGUNDA ETAPA.**

Contrata: FINDETER

Valor: 5.956 millones

Alcance: Instalación de 3 Km de Línea de impulsión y optimización PTAR

Familias beneficiadas: 256

Estado: Suspendido. Avance 70%

El proyecto está suspendido ya que la impulsión hacia el sistema de tratamiento pasa por un barrio llamado Pueblito Nuevo (Cuenca 6), pero es viejo de estar allí, y han exigido se les construya sistema de alcantarillado. La solución de alcantarillado implica la construcción den EBAR. Esta semana el municipio firmó las escrituras del lote donde se ubicará la EBAR, por lo que hace viable este nuevo proyecto que se contrataría aparte y para el cual se le asigna en este PAEI recursos en el orden de \$1.300 millones

➤ **CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO DE LA PEÑA MUNICIPIO DE SABANALARGA.**

Contrata: FINDETER

Valor: 5.400 millones – crédito BID

Impacto: Cobertura pasa de 0 al 100%; Eliminación de descargas de Aguas Residuales sin tratar al Guájaro

Familias beneficiadas: 960

Estado: En ejecución. Avance 60%

El Departamento aportó el lote por valor de \$88 millones; se encuentran asignados los recursos para la PTAR por \$7.200 millones

Dentro de los proyectos con asignación de recursos y viabilizados por el Ministerio de Vivienda – MVCT, contratados por Findeter, se encuentran:

➤ **CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GALAPA.**

Contrata: FINDETER

Valor: 3.989 millones

Alcance: Construcción de Tanque de almacenamiento en vidrio fusionado al acero de 5.000 m3

Familias beneficiadas: 4.122

Estado: Adjudicado, pendiente acta de inicio, sujeto a firma de convenio con la Triple A interventoría y el municipio de Galapa.

➤ **CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO CUPINO – MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA**

Contrata: FINDETER

Valor: 12.420 millones

Alcance: Construcción de Tanque de almacenamiento en vidrio fusionado al acero de 3.000 m3

Impacto: Incrementar cobertura y garantizar presiones

Familias beneficiadas: 3.294

Estado: Contratado, pendiente acta de inicio.

➤ **REUBICACION CAPTACION SISTEMA ACUEDUCTO REGIONAL LURUACO AL CANAL DEL DIQUE.**

Valor: 32.321 millones

Alcance: 36 Km de línea de impulsión de 400 mm; Barcaza (3equipos de bombeos x 42lps)

Impacto: Garantizar volumen y calidad de agua tanto a cabeceras como al sector rural

Familias beneficiadas: 5.914

Estado: Contratado.

➤ **AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO SECTORES 1 Y 2 – ETAPA 1 – MUNICIPIO DE SABANALARGA.**

Valor: 3.500 millones

Impacto: Ampliar cobertura del 90 al 99%

Familias beneficiadas: 3.114

Estado: Pendiente de reformulación.

Otra fuente de recursos es **EI FONDO DE ADAPTACION**, el cual asigno recursos para los siguientes Proyectos por valor de \$11.123 millones:

MUNICIPIO	PROYECTO	COSTO en millones \$	OBERVACIÓN
SANTA LUCIA	Sistema de tratamiento de aguas residuales: rehabilitación laguna existente y construcción de humedales en el municipio de Santa Lucía -	3.804	Ejecutado
CAMPO DE LA CRUZ	Adecuación de laguna existente, estación de bombeo y línea de impulsión de la PTAR del municipio Campo de la Cruz.	4.194	En Ejecución Avance 95%
CANDELARIA	Construcción segundo Módulo PTAR	3.135	Formulación de Pliegos
	SUBTOTAL	11.123	

➤ **REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – MUNICIPIO DE SANTA LUCIA.**

Contrata: Fondo Adaptación

Valor: 3.804 millones

Alcance: Desarenador, lecho de secado, rehabilitar laguna existente, humedal superficial, relleno y adecuación vía.

Familias beneficiadas: 2.767

Estado: Ejecutado

➤ **OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ.**

Contrata: Fondo Adaptación

Valor: 4.194 millones

Alcance: Optimización primer módulo de la laguna tres (3) EBAR de 33 lps y una Línea de impulsión al río de 1.8 km 250 mm

Familias beneficiadas: 4.218

Estado: En ejecución, Avance 95%

➤ **CONSTRUCCION DEL SEGUNDO MODULO DE LA PTAR – MUNICIPIO DE CANDELARIA.**

Contrata: Fondo Adaptación

Valor: 3.135 millones

Alcance: Construcción Segundo modulo

Familias beneficiadas: 3.985

Estado: Formulación de Pliegos, ya se adquirieron los lotes.

Adicionalmente se presentaron proyectos a la Corporación Regional Autónoma – CRA: tiene asignado recursos por \$ 51.056 millones.

PROYECTO	VALOR EN MILLONES DE \$ PESOS	ESTADO
OBRAS COMPLEMENTARIAS PTAR CAMPO DE LA CRUZ	2.633	En ejecución, avance 63%
PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE PIOJO	5.423	Adjudicado en dic/18
PTAR SABANAGRANDE - SANTO TOMAS – PALMAR DE VARELA	43.000	En ajustes diseño
SUBTOTAL	\$ 51.056	

➤ **CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PTAR CAMPO DE LA CRUZ**

Valor: 2.633 millones

Alcance: Adecuación 2do módulo PTAR (filtros, Geomembrana, taludes, estructura entrada/salida)

Familias beneficiadas: 2.955

Estado: En Ejecución 63%

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- MUNICIPIO DE PIOJO

Valor: 5.423 millones

Alcance: Desarenador, UASB, Laguna de estabilización UV y la instalación de 1.5 kms línea impulsión

Familias beneficiadas: 614

Estado: Adjudicado en Enero de 2019 – falta interventoría

➤ **CONSTRUCCION PTAR REGIONAL - SABANAGRANDE- SANTO TOMAS -PALMAR DE VARELA**

Valor: 43.000 millones

Impacto: Tratamiento adecuado aguas residuales de los 3 municipios y saneamiento de las ciénagas del convento y santo tomas

Alcance: 3 UASB, Laguna tratamiento secundario 2 humedales de afinamiento 11.6 Km línea de impulsión 16 – 18" Línea impulsión al río y 3 EBARS

Familias beneficiadas: 17.150

Estado: En Juste con la Ventanilla Departamental.

Continúa la Doctora Loretta con los proyectos que serán presentados al OCAD Regional, Pendiente asignación por \$ 36.120 millones.

PROYECTO	MONTO millones \$	ESTADO
AMPLIACION PTAP BARANOA POLONUEVO	18.357	En Contratación
REDES ALCANTARILLADO CUENCA 2	17.763	Pendiente cumple por parte del MVCT Y DNP. Con SGP \$920m
TOTAL OCAD	\$ 36.120	

➤ **AMPLIACIÓN DE LA PTAP REGIONAL – BARANOA - POLONUEVO**

Valor: 18.357 millones
Alcance: Ampliar capacidad de la Planta de 165 a 265 lps, le da factibilidad técnica a conducciones para corregimientos Campeche y Pital de Megua
Familias beneficiadas: 14.200
Estado: En contratación.

➤ **CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 2 – MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA**

Valor: 20.000 millones
Impacto: Cobertura redes alcantarillado pasa de 50 al 99%
Alcance: 31 km de redes 8 -24", Construcción EBAR - 3 Bombas de 81,1 lps cada una y la instalación de 1.2 km impulsión
Familias beneficiadas: 2.185
Estado: Viabilizado Técnicamente, pendiente con el Cumple del MVCT

El Gobernador Verano resaltó la importancia de utilizar acueductos regionales por ser más fácil su operación, y no depender de acueductos puntuales en cada corregimiento o municipio.

Así mismo el Doctor Juan Pablo Serrano, resaltó la importancia de construir acueductos regionales, siendo Antioquia y atlántico pioneros en estos tipos de acueductos, ya que manejan los conceptos de regionalización evidenciándose estos en los indicadores; siendo atlántico el que los tiene mejor estructurado.

Destaco que el Gobierno actual y el MVCT está interesado en la construcción de sistemas regionales ya que solo así, Se garantizara la operatividad efectiva de los acueductos.

▪ **EJECUCION DEL PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSION PAEI 2018.**

A continuación La Doctora Jiménez presenta un balance de la inversión ejecutada dentro del marco del PAP PDA Atlántico.

Cifras en millones \$	
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	
FUENTE	MONTO
SGP DISPONIBLE a 15 abril -2018	\$ 15.422
SGP - 2018	\$ 15.204
AUDIENCIAS PUBLICAS	\$ 575
OTROS – NACION - RUTAS	\$ 1.437
TOTAL	\$ 32.638

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL PAEI - 2018					
MUNICIPIO	PROYECTO	MODIFICACION PROPUESTA AL PAEI 2018			OBSERVACIONES
		MONTO (\$ Millones)			
		SGP	AUD PUB	OTROS	
PIOJO	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	2.100			CONTRATADO
PIOJO	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5.200			LOTE PARA CRIBADO EL MUNICIPIO LO ENTREGÓ PARA PARQUE HUBO NECESIDAD CONSEGUIR OTRO. VIABILIZADO. EN TRAMITE CDR ANTE EL FIA
BARANOA	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 4	3.300			EN CONTRATACIÓN CIERRE FEB 12/19
GALAPA	SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANIZACION MUNDO FELIZ Y BARRIO PETRONITAS SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE GALAPA	1.245			CONTRATO LO EJECUTA FINDETER. MONTO EQUIVALE A RECURSOS ADICIONALES QUE SE REQUIRIERON. ESTE PROYECTO LO EJECUTA FINDETER CON FUENTE DE RECURSOS DE UN CONVENIO SUSCRITO ENTRE DPTO, MUNICIPIO Y MVCT. FINDETER SOLICITÓ RECURSOS ADICIONALES Y SE ASIGNARON COMO FUENTE SGP
TUBARA	LINEA DE CONDUCCION PARA INDEPENDIZAR CABECERAS DE PLAYAS ACUEDUCTO COSTERO	6.500			YA CUENTA CON CDR, EN TRAMITE AMPLIACIÓN SERVIDUMBRE. DISEÑO LISTO SE ESTIMA CONTAR CON TRÁMITE SERVIDUMBRE EN EL MES DE MARZO
GALAPA	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CUENCA 6 DEL MUNICIPIO DE GALAPA,	1.200			DISEÑO LISTO. EN TRAMITE LOTE PARA EBAR POR PARTE DEL MUNICIPIO, INICIALMENTE TRAMITÓ SERVIDUMBRE NO COMPRA. YA SE FIRMÓ ESCRITURA. MONTO PASA A 2019
JUAN DE ACOSTA	ADICIONAL PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA	1.300			PROYECTO LO EJECUTA MUNICIPIO CON RECURSOS DEL DPS. PENDIENTE TRAMITE MUNICIPIO CON DPS SOBRE RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS PARA FINALIZAR PROYECTO PASA AL 2019. FALTAN RECURSOS EN CUANTÍA DE \$4.300 MILLONES. EL CONVENIO MUNICIPIO DPS CUENTA CON UNOS RECURSOS POR \$3000 MILLONES PARA UN POLIDEPORTIVO QUE NO SE VAN A USAR POR LO QUE LE HEMOS SUGERIDO AL ALCALDE QUE CON EL ÁNIMO DE QUE SE CULMINE EL PROYECTO TRAMITE ANTE EL DPS LA REASIGNACIÓN DE ESOS 3000 MIL MILLONES PARA EL TEMA DE ALCANTARILLADO Y EL DEPARTAMENTO PODRÍA APOYAR CON LOS 1300 FALTANTES.
REPELON	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA PTAR DE REPELON	1.800			VENTANILLA DE VIABILIZACIÓN SOLICITÓ AL OPERADOR SUR(DISEÑADOR) AJUSTAR DISEÑOS LOS CUALES ENTREGARA FEB 8/19
SOLEDAD	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSIÓN Y EBAR EL ESFUERZO		380	1.437	YA SE CUENTA CON LOTE PARA EBAR. AAA(DISEÑADOR) ELABORA DISEÑOS

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL PAEI - 2018					
MUNICIPIO	PROYECTO	MODIFICACION PROPUESTA AL PAEI 2018			OBSERVACIONES
		MONTO (\$ Millones)			
		SGP	AUD PUB	OTROS	
DPTO	MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACION DE PROYECTOS	350			CONTRATADO Y EN EJECUCIÓN FINALIZA EN EL MES DE MARZO DE 21019
PDA	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	101			CONTRATADO Y EN EJECUCIÓN FINALIZA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 21019
GLOBAL	GASTOS DEL GESTOR	520			CONTRATADO Y EN EJECUCIÓN FINALIZA EN EL MES DE MARZO DE 21019
PDA	PLAN DE ASEGURAMIENTO	3.235			PRESENTADO AL MVCT 2750 MILLONES PARA PAGO PASIVOS LABORALES
PDA	PLAN AMBIENTAL	350			PASA AL 2019
DPTO	GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	410			PASA AL 2019
DPTO	ESTUDIOS Y DISEÑO	150			CUENTA CON CDR
SABANALARGA	CONDUCCIÓN AGUA POTABLE CORREGIMIENTOS DE GALLEGO PATILLA MIRADOR	1.000			PASA A 2019 YA QUE MONTO PROYECTO ES MAYOR
PALMAR DE VARELA	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 2 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	832			MONTO PROYECTO ES 17,76 MIL MILLONES EL CUAL ESTA PRESENTADO AL OCAD, PENDIENTE CUMPLE DEL MVCT Y DNP.
SANTO TOMAS	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO BARRIO LA ARENOSA, MUNICIPIO SANTO TOMAS	0	195		SOLICITADA REFORMULACIÓN AL MVCT. PENDIENTE APORTAR DOCUMENTOS SOLICITADOS EN VISITA REALIZADA FEB 3/19
CAMPO DE LA CRUZ	ADICIONAL OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUEDUCTO DE CAMPO DE LA CRUZ	700			REFORMULACIÓN SE PRESENTARÁ POR \$779 MILLONES POR LO QUE DEBEN ASIGNARSE RECURSOS DEL PAEI 2019
SANTO TOMAS	ADICIONAL REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO PALONEGRO Y VILLA CATALINA	333			PENDIENTE APROBACIÓN CRUCE POR PARTE DE ANI. SE PRESENTARÁ REFORMULACIÓN SEMANA FEB 11/19
		30.626	575	1.437	
	TOTAL PAEI - 2018			\$ 32.638	

**DISTRIBUCCION DE LOS RECURSOS
POR COMPONENTE**

COMPONENTE	SGP - DPTO	CONV. NACION	AUD PUB	TOTAL	%CDR	OBSERVACION
ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	4.206			4.206	35%	
Pasivos Laborales	3.235			3.235	500	
Plan de Gestión Social	101			101	101	
Ventanilla de viabilizacion	350			350	350	
Gastos del Gestor	520			520	520	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	24.510	1437	575	26.522	69%	
Acueducto	9.300		195	9.495	8600	
Alcantarillado	15.210	1437	380	17.027	9745	
Aseo						
Otros proyectos						
PREINVERSION	150			150	100%	
AMBIENTE	350			350		
PROYECTOS DE DESARROLLO DEL SECTOR RURAL	1.000			1000		
Acueducto	1000			1000		
Alcantarillado						
GESTION RIESGO SECTORIAL	410			410		
TOTAL PAEI - 2018	30.626	1.437	575	32.638	65%	VALOR CDR \$ 19.996

A continuación la doctora Loretta, hace una reseña de los avances de los proyectos que forman parte del PAEI 2018, que se ejecutaron y se encuentran en ejecución:

➤ **OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – MUNICIPIO DE REPELON.**

Valor: 2.271 millones
Impacto: Ampliación PTAP, pasa de 30 a 70lps
Familias beneficiadas: 4.243
Estado: Ejecutado

➤ **CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO – MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA.**

Valor: 1.352 millones
Impacto: cobertura pasa de 94 al 99%
Familias beneficiadas: 1.060
Estado: Ejecutado

➤ **LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE HACIA EL MORRO- Ampliación Sistema de Acueducto Costero**

Valor: 1.621 millones

Impacto: Cobertura de 100% agua potable

Alcance: Tanque de almacenamiento de 38m³ Y 4.450 mts Instalación de tubería

Familias beneficiadas: 72

Estado: Suspendido - Avance 95%

➤ **AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL SABANALARGA - PONEDERA.**

Valor: 10.100 millones

Alcance: Se duplica capacidad de 200 a 400 lps

Familias beneficiadas: 18.650

Estado: En ejecución – Avance 22%

Este proyecto dará factibilidad técnica para el suministro de agua a los corregimientos de Sabanalarga (Patilla, gallego y Mirador).

➤ **OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ.**

Valor: 2.353 millones

Impacto: Mejorar la calidad del servicio de agua potable

Alcance: Optimización Floculadores, Filtros, Tanque elevado, lecho de secado lodos

Familias beneficiadas: 4.218

Estado: En ejecución – Avance 63%

➤ **CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR 2 – MUNICIPIO DE SABANALARGA**

Valor: 6.273 millones

Impacto: Almacenamiento de agua para distribución del sector 2

Alcance: Tanque de vidrio fusionado al acero 1500m; 3480ml, tubería 400 mm PEAD

Familias beneficiadas: 671

Estado: En ejecución – Avance 25%

➤ **CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIO LA ARENOSA - SANTO TOMAS.**

Valor: 716,5 millones

Impacto: Cobertura pasa de 94 al 99%

Alcance: Instalación de 3.354 ml tubería de 90 – 200 mm

Familias beneficiadas: 280 y 300 viviendas adicionales

Estado: En ejecución – Avance 70%

➤ **CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS CUENCAS 1 Y 2 – MUNICIPIO DE USIACURI**

Valor: 6.295 millones

Impacto: Cobertura redes alcantarillado pasa de 70 al 88%

Alcance: 4.911 ml de redes, 2 Esbares (15 y 30 lps) y Líneas de impulsión – 2.190ml

Familias beneficiadas: 2.405

Estado: En ejecución – Avance 70%

➤ **CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO - BARRIOS PALONEGRO Y VILLA CATALINA - SANTO TOMAS.**

Valor: 1.354 millones
Impacto: Cobertura redes alcantarillado pasa de 84% al 88%
Alcance: Instalación de 2.907 ml de redes
Familias beneficiadas: 280
Estado: En ejecución – Avance 70%

➤ **CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE – MUNICIPIO DE PIOJO**

Valor: 2.100 millones
Impacto: Permitirá destinar tanque actual de 370 m3 para corregimientos
Alcance: Tanque de almacenamiento de 700 m3
Familias beneficiadas: 916
Estado: Contratado

➤ **CONSTRUCCION REDES ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR CUENCA 4 – MUNICIPIO DE BARANOA**

Valor: 3.047 millones
Impacto: Incrementa cobertura de redes del 74 al 77%
Alcance: 3.045 ml de redes, EBAR de 24 lt/seg
Familias beneficiadas: 671
Estado: En Contratación

3-. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN RECURSOS PARA EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.

Se continúa con la aprobación del monto para el Plan de Gestión Social 2019.

La profesional Isis Bruges realiza la descripción de las acciones en Capacitación, Participación Ciudadana y Comunicación que se desarrollaron en el plan de gestión social año 2018

Capacitación enfocada en jornadas educativas dirigidas a estudiantes, docentes, líderes comunitarios, veedores, usuarios de los servicios del sector rural y urbano en temas de Uso eficiente y ahorro del agua entre otros y la conformación de grupo de multiplicadores;

Participación Ciudadana, que acompaña la gestión social a los contratistas en las obras que se financian con recursos del PAP PDA Atlántico a través de las reuniones de socialización de obras, la conformación de los comités de sostenibilidad y de veeduría, también involucra la capacitación de acuerdo a las obras.

Comunicación, donde se busca fortalecer las actividades del PAP –PDA Atlántico con la actualización de página web, la imagen corporativa en cada una de las acciones de trabajo.

De acuerdo a lo expresado por la profesional asignada en el años 2018 se buscó también vincular a los operadores de los servicios en cada municipio para apoyar las actividades de capacitación, logrando realizar 23 encuentros con usuarios y acompañamiento a 10 obras que se vienen adelantando en el departamento.

Para el año 2019 argumento que se llevara a 10 instituciones educativas el programa Clubes Defensores del Agua de igual manera continuar con los talleres a comunidades.

A continuación se relacionan las acciones realizadas en el 2018.

LÍNEA	ESTRATEGIA	META 2018	RESULTADOS 2018
CAPACITACIÓN Talleres de capacitación con los usuarios – colegios, estudiantes en temas de Agua y Saneamiento Básico en el sector urbano y rural	Uso eficiente del servicios de acueducto y saneamiento básico	23 Talleres (16 corregimientos y 7 cabeceras beneficiadas).	34 Talleres realizados con Usuarios (16 talleres en 12 corregimientos y 18 talleres realizados en 10 cabeceras)
	Cultura del Agua	Fortalecer el uso y ahorro eficiente del agua en las instituciones educativas.	5 instituciones vinculadas – 6 talleres realizados - 172 estudiantes participantes.
	Clubes defensores del agua	3 instituciones con grupos de clubes defensores del agua.	3 grupos conformados Municipio de Ponedera; Corregimiento de Molinero Municipio de Malambo. 16 talleres realizados con niños del club.
	Empresas Operadoras - Veeduría ciudadana	20 veedores capacitados	7 Talleres - un promedio de 25 líderes asistentes por sesión. Acompañamiento en Obras

LÍNEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Reuniones de socialización de las obras a comunidad, líderes y veedores.
10 reuniones de socialización de Obras – 512 participantes (9 obras que se acompañaron):	

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / CONTROL SOCIAL

9 Obras Socializadas
512 Asistentes

1. Malambo – PTAR
2. Redes AC y ALc Soledad 2000
3. La Peña – Instalación Redes Alcantarillado
4. Santo Tomás – La Arenosa (Ac)
5. Santo Tomas – Palo Negro y Villa Catalina (Alc)
6. Usiacurí - Instalación Redes Alcantarillado
7. Sabanalarga – Ampliación Redes (Tanque Ac)
8. Ponedera – Ampliación PTAP (Ac)
9. Campo de la Cruz Ampliación PTAP

LÍNEA DE COMUNICACIÓN	Diseñar material lúdico-pedagógico en cultura del agua -
Mantener a la comunidad en general informada de las actividades desarrolladas por las obras.	

**APROBACIÓN RUBRO PARA AÑO 2019
\$20 MILLONES**

ACCIONES	FORMA DE EJECUCION	RESPONSABLE	COSTO ESTIMADO	FUENTE DE FINANCIACION PREVISTA	COORDINA
ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN A USUARIOS Y COMUNIDAD EN TEMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA	Contratación de prestación de servicios profesionales	DEPARTAMENTO	\$ 20.000.000	SGP	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
CONFORMACIÓN DE CLUBES DEL AGUA EN COLEGIOS	Contratación de prestación de servicios profesionales	DEPARTAMENTO		SGP	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
ACOMPAÑAMIENTO A LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO – PLANES SOCIALES DE OBRA	Contratación de prestación de servicios profesionales	DEPARTAMENTO		SGP	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
TOTAL			20.000.000		

El monto fue aprobado por los miembros del Comité Directivo sujeto a la carta de aceptación y visto bueno del MVCT para su ejecución.

4. - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN RECURSOS PARA EL PLAN DE ASEGURAMIENTO

La funcionaria Genoveva Chams presentó informe relacionado con el avance de del Plan de Aseguramiento del 2018, resaltando que para LA CULMINACION de las actividades previstas en el mismo, se hace necesario la aprobación por parte del comité directivo, de la ampliación de la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, lo cual fue aprobado por los miembros del comité. El contenido del plan de aseguramiento se mantiene con las actividades previstas en el año 2018 revisadas y aprobadas por el MVCT.

- PASIVOS LABORALES FINANCIADOS CON RECURSOS INSFOPAL

Se presentó informe actualizado relacionado con la aplicación de los recursos que a la fecha del comité se han ejecutado a través de los convenios celebrados entre los municipios, el departamento del atlántico y el MVCT. El detalle de la información se muestra a continuación.

RELACION PASIVOS LABORALES							
FUENTE INSFOPAL							
MUNICIPIO	CONVENIO	VALOR CONVENIO en millones \$	VALOR PASIVOS AVALADOS	VALOR POR EJECUTAR	VALOR EJECUTADO	No. BENEFICIARIOS	ESTADO ACTUAL
Sabanagrande - Santo Tomás ASOSASA E.S.P	026/2015	7.000	4.009.4	131	3.878	40	PAGADOS 10, RADICADOS EN FIDUCIA 28 PENDIENTE AUTORIZACIÓN MVCT. 2 PASIVOS RESTANTES SE RADICARAN EN FEBRERO/19.
Palmar de Varela	020/2015	580	499	0	499	8	PAGADOS
Manatí	061/2015	2.695	2.667	1.660	1.007	33	PAGAGOS 12. PROGRAMADA RADICACIÓN EN FIDUCIA 21 RESTANTES MES DE FEBRERO
Candelaria	022/2015	1.065	722	0	722	18	PAGADOS
Luruaco	028/2015	192	192	0	192	5	PAGADOS.
Repelón	027/2015	135	135	0	135	3	PAGADOS
Santa Lucia	024/2015	165	165	0	165	3	PAGADOS
TOTALES		11.832	8.389			110	

Montos en millones de pesos (\$)

- PASIVOS LABORALES FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGP – APSB

Se informó, que el departamento siguiendo los lineamientos de la ley 1176 de 2007, solicitó al MVCT mediante Oficios No. 20185000003111 de agosto 14 de 2018 y 20185000004391 de octubre 22 de 2018 la autorización para que se expidiera por parte del grupo SGP- APSB, la autorización al Departamento del Atlántico para cofinanciar los pasivos laborales de los municipios de Manatí, Candelaria, Repelón, Luruaco y Santa Lucía, dentro del proceso de vinculación del operador especializado Aguas del Sur S.A E.S.P, destinado al saneamiento de los pasivos laborales de las empresas de servicios públicos oficiales a cargo de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado que funcionaron en estos municipios y que en la actualidad se encuentran en proceso de liquidación.

Se resaltó que a la fecha del comité no se ha recibido respuesta alguna del MVCT solicitando se proceda a agilizar la respuesta por parte del ministerio con el fin de proceder a la aplicación de los recursos por valor de \$ 2.740 millones aprobados en comité anteriores.

A continuación se detalla los valores de los pasivos remitidos al MNVCT, con base a la información presentada y sustentada por los municipios.

**COFINANCIACION PAGO DE PASIVOS LABORALES
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**

MUNICIPIO	NUMERO DE BENEFICIARIOS	FUENTE DE RECURSOS		TOTAL PASIVO LABORAL
		Recursos SGP Departamento	Recursos Propios Municipio	
Manatí	17	1.670.380.436	88.000.000	1.758.380.436
Candelaria	8	382.719.603	21.000.000	403.719.603
Repelón	5	284.821.370	16.000.000	300.821.370
Luruaco	2	206.465.047	10.870.000	217.335.047
Santa Lucía	1	56.334.646	2.965.000	59.299.646
TOTAL	33	2.600.721.102	138.835.000	2.739.556.102

- **Aprobación Monto Plan de Aseguramiento 2018 - 2019**

PLAN DE ASEGURAMIENTO – 2018 – 2019

ACCIONES	DURACION	RESPONSABLE	COSTO ESTIMADO	
			2018	FUENTE DE FINANCIACION PREVISTA
4.1.1.FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION – OPERACIONAL RURAL			617.200.000	
4.1.1.1 Rural				
Acompañamiento Administrativo, Financiero y Comercial	12 meses	DEPARTAMENTO Y SENA	123.600.000	SGP DEPARTAMENTO
Acompañamiento Operacional	12 meses	DEPARTAMENTO Y SENA	82.800.000	SGP DEPARTAMENTO
Catastro de usuarios	7 meses	DEPARTAMENTO	210.800.000	SGP- recursos propios Departamento
Catastro de Redes	9 meses	DEPARTAMENTO	200.000.000	SGP DEPARTAMENTO
4.1.2. PASIVOS LABORALES:			2.740.000.000	
4.1.2.1 Financiación de Pasivos Laborales	10 meses	DEPARTAMENTO	2.740.000.000	SGP DEPARTAMENTO
4.1.3. DIAGNOSTICO SIASAR II FASE	12 meses	DEPARTAMENTO	82.800.000	SGP DEPARTAMENTO
TOTAL			\$ 3.440.000.000	

5- APROBACION PAEI 2019:

A continuación se describe la inversión a aprobar por fuente de recursos dentro del marco del PAP PDA Atlántico.

**PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSION
PAEI – 2019**

Cifras en millones \$	
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	
FUENTE	MONTO (\$)
SGP DISPONIBLE a 15 enero de 2019	\$ 15.042
SGP - 2019	\$ 16.311
AUDIENCIAS PUBLICAS	\$ 612
OTROS – NACION - RUTAS	\$ 1.475
TOTAL	\$ 33.440

El PAEI 2018 Asciede a la suma de \$ 33.440 millones, de los cuales \$ 1.475 millones corresponden al convenio No. 34 que se suscribió con el MVCT para las redes de acueducto y alcantarillado en las rutas del Transmetro.

A continuación se presenta el cuadro de las inversiones previstas por sectores

DISTRIBUCCION DEL PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES - 2019

COMPONENTE	SGP - DPTO	BOLSA TER	AUD PUB	TOTAL
ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	3.791	0	0	3.791
Plan de Aseguramiento	2.950	0	0	2.950
Plan de Gestión Social	20	0	0	20
Ventanilla de viabilizacion	150	0	0	150
Gastos del Gestor	671	0	0	671
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	18,722	1.475	612	20.809
Acueducto	5.979	0	240	6.219
Alcantarillado	12.743	1.475	372	14.590
Aseo	0	0	0	0
Otros proyectos	0	0	0	0
PREINVERSION	0	0	0	0
AMBIENTE	440	0	0	440
PROYECTOS DE DESARROLLO DEL SECTOR RURAL	7.900	0	0	7.900
Acueducto	3500	0	0	3.500
Alcantarillado	4.400	0	0	4.400
GESTION RIESGO SECTORIAL	500	0	0	500
TOTAL PAEI - 2019	31.353	1.475	612	33.440

El PAEI 2019, contempla en Aseguramiento de la prestación de los servicios un valor de \$ 3.791 millones, que son básicamente el plan de aseguramiento por \$ 2.950 millones sujeto a la aprobación de la modificación por parte del MVCT, \$ 20 millones Plan de Gestión Social, el cual está pendiente de aprobación por parte del MVCT, \$ 150 millones de la Ventanilla de viabilización Departamental, y \$ 671 millones del Gasto del Gestor, pendiente de la certificación del Gobernador para su aprobación; \$ 18.722 millones, en el sector de Infraestructura en Agua y Saneamiento, de los cuales Acueducto \$ 5.979 millones y Alcantarillado \$ 12.743 millones, en Ambiente \$ 440 millones, proyecto de desarrollo del sector rural \$ 7.900 millones y Gestión del riesgos Sectorial \$ 500 millones.

A continuación se presentó al Comité Directivo los potenciales proyectos a aprobar dentro del marco del PAEI 2019.

POTENCIALES PROYECTOS PAEI - 2019				
MUNICIPIO	PROYECTOS	MONTO (\$ Millones)		
		SGP	AUD PUB	OTROS
GALAPA	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CUENCA 6 DEL MUNICIPIO DE GALAPA,	1.300		
JUAN DE ACOSTA	ADICIONAL PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA	1.300		
REPELON	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA PTAR DE REPELON	2.200		
SOLEDAD	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSIÓN Y EBAR EL ESFUERZO	2.153	372	1.475
SABANALARGA	CONTRAPARTIDA REDES ACUEDUCTO SECTOR 1 Y 2 ETAPA 1	800		
SABANALARGA	OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS REDES DE ACUEDUCTO SBLARGA SECTOR 1 Y 2 ETAPA II	400		
USIACURI	ADICIONAL REDES ALCANTARILLADO CUENCAS 1 Y 2	1.511		
GALAPA	REHABILITACIÓN EBARES SISTEMA ALCANTARILLADO MUNDO FELIZ	350		
SABANALARGA	ADICIONAL PTAP REGIONAL SABALARGA PONEDERA	1.500		
PALMAR DE VARELA	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 2 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA - CONTRAPARTIDA	920		

POTENCIALES PROYECTOS PAEI - 2019				
	PROYECTOS	MONTO (\$ Millones)		
		SGP	AUD PUB	OTROS
SANTO TOMAS	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO BARRIO LA ARENOSA, MUNICIPIO SANTO TOMAS - ADICIONAL	0	240	
SANTO TOMAS	ADICIONAL REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO PALONEGRO Y VILLA CATALINA	333		
CAMPO DE LA CRUZ	ADICIONAL OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUEDUCTO DE CAMPO DE LA CRUZ	779		
BARANOA	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MANZANARES	505		
SABANALARGA	CONDUCCIÓN AGUA POTABLE CORREGIMIENTOS DE GALLEGO PATILLA MIRADOR	3.500		
CAMPO DE AL CRUZ	REHABILITACIÓN PTAR BOHORQUEZ	300		
POLONUEVO	OBRAS COMPLEMETARIAS ALCANTARILLADO SANTARIO PITALITO	1.400		
CANDELARIA	REDES ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO CARRETO	1.200		
PONEDERA	REDES ALCANTARILLADO BARRIO LA CANDELARIA	795		
PONEDERA	PROLONGACIÓN DESCARGA EFLUENTE PONEDERA ETAPA 1	1.500		
SOLEDAD	REDES DE ACUEDUCTO BARRIO CIUDAD PARAISO ETAPA I	2.500		
MALAMBO	REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO MESOLANDIA cofinanciación	1.376		
DPTO	MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACION DE PROYECTOS	150		
DPTO	GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	500		
PDA	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	20		
GLOBAL	GASTOS DEL GESTOR	671		
PDA	PLAN DE ASEGURAMIENTO	2.950		
PDA	PLAN AMBIENTAL	440		
	SUBTOTAL PAEI 2019	31.353	612	1.475
	TOTAL PAEI - 2019	33.440		

Los siguientes son los potenciales proyectos del PAEI 2019

➤ **CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CUENCA 6 – MUNICIPIO DE GALAPA**

Valor: 1.300 millones

Alcance: Redes de alcantarillado y EBAR

Familias beneficiadas: 256

Estado: En diseño y pendiente lote.

Monto sujeto al valor de la viabilización por parte de la ventanilla regional.

➤ **CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DE ACOSTA – MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA**

Valor Inicial: 15.050 millones – DPS

Valor Adicional: 1.300 millones

Alcance: Construcción de 14.122 ml de redes PTAR con UASB

Familias beneficiadas: 2.672

Estado: Suspendido

➤ **CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PTAR DE REPELON DEL MUNICIPIO DE REPELON**

Valor: 2.200 millones

Objetivo: Garantizar tratamiento aguas residuales

Familias beneficiadas: 3.394

Estado: En diseño y pendiente de viabilización.

➤ **CONSTRUCCION ESTACION ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE IMPULSION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL ESFUERZO – MUNICIPIO DE SOLEDAD**

Valor: 4.000 millones

Alcance: Instalación de 2.850 ml impulsión 300mm y construcción EBAR

Familias beneficiadas: 900

Estado: En diseño y pendiente de viabilización.

➤ **AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO SECTORES 1 Y 2 – ETAPA 1 – MUNICIPIO DE SOLEDAD**

Valor: 4.300 millones (\$ 3500 millones - Convenio MVCT y \$ 800 millones Dpto.)

Impacto: Ampliar cobertura del 90% al 99%

Familias beneficiadas: 3.114

Estado: En ajuste de precio por el MVCT

➤ **CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS CUENCAS 1 Y 2 – MUNICIPIO DE USIACURI**

Valor Inicial: 6.295 millones
Valor Adicional: 1.511 millones
Impacto: Cobertura redes alcantarillado pasa de 70 al 88%
Alcance: 4.911 ml de redes, 2 Esbares (15 y 30 lps) y Líneas de impulsión – 2.190ml
Familias beneficiadas: 2.405
Estado: En ejecución – Avance 70%

➤ **ADECUACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE MUNDO FELIZ – MUNICIPIO DE GALAPA**

Valor Inicial: 5.956 millones
Valor Adicional: 350 millones
Alcance: Instalación de 3 Km de Línea de impulsión y optimización PTAR
Familias beneficiadas: 256
Estado: Suspendido. Avance 70%

➤ **CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 2 – MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA**

Valor: 20.000 millones – recursos SGR y 920 millones Dpto
Impacto: Cobertura redes alcantarillado pasa de 50 al 99%
Alcance: 31 km de redes 8 -24”, Construcción EBAR - 3 Bombas de 81,1 lps cada una y la instalación de 1.2 km impulsión
Familias beneficiadas: 2.185
Estado: Viabilizado Técnicamente, pendiente con el Cumple del MVCT

➤ **CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIO LA ARENOSA - SANTO TOMAS.**

Valor inicial: 716,5 millones
Valor Adicional: 240 millones
Impacto: Cobertura pasa de 94 al 99%
Alcance: Instalación de 3.354 ml tubería de 90 – 200 mm
Familias beneficiadas: 280 y 300 viviendas adicionales
Estado: En ejecución – Avance 70%

Principales actividades adicionales:

La instalación de tubería PEAD de 90 mm a 200 mm pasa de 4.224 ml a 6.539 ml y la construcción de Registros domiciliarios pasa de 160 a 274 Unidad

➤ **OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ.**

Valor Inicial: 2.353 millones
Valor Adicional: 779 millones
Impacto: Mejorar la calidad del servicio de agua potable
Alcance: Optimización Floculadores, Filtros, Tanque elevado, lecho de secado lodos
Familias beneficiadas: 4.218
Estado: En ejecución – Avance 63%

Las principales actividades de las obras adicionales son:

- Construcción de sistema de almacenamiento y dosificación de coagulantes y ayudantes de floculación
- Construcción de lechos de secado
- Construcción de estación de bombeo de lodos y aguas de lavado de filtros
- Construcción de sistema de retrolavado de filtros de planta vieja
- Adecuación de laboratorios
- construcción de sistema de sifones para evacuación de lodos de sedimentadores
- Obras civiles tanque elevado
- Adecuaciones sótano planta vieja
- Obras civiles complementarias
- Obras civiles eléctricas
- Construcción de cerramiento de lote de planta de tratamiento

➤ **CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR 2 – MUNICIPIO DE SABANALARGA**

Valor Inicial: 6.273 millones

Inversión adicional: 400 millones

Impacto: Almacenamiento de agua para distribución del sector 2

Alcance: Tanque de vidrio fusionado al acero 1500m; 3480ml, tubería 400 mm PEAD

Familias beneficiadas: 671

Estado: En ejecución – Avance 25%

Mayores cantidades de obra - obras adicionales y complementarias:

Acero de Refuerzo de 60.000

- Concreto de 4.500 psi. Para vigas aéreas y nodos columnas (5.000 psi)

-Relleno con material seleccionado

-Cerramiento definitivo del lote donde se construye el tanque

-Sistema de Iluminación

-Sistema de pararrayos y aterrizamiento tanque metálico

-Obras de Drenaje

➤ **CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO - BARRIOS PALONEGRO Y VILLA CATALINA - SANTO TOMAS.**

Valor: 1.354 millones
Inversión adicional: 333 millones
Impacto: Cobertura redes alcantarillado pasa de 84% al 88%
Alcance: Instalación de 2.907 ml de redes
Familias beneficiadas: 280
Estado: En ejecución – Avance 70%

Principales actividades adicionales:

La instalación de tubería de alcantarillado de 8" a 10" pasa de 1.890 ml a 2.537 ml y la construcción de Registros domiciliarios pasa de 140 a 231 Unidad

➤ **AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL SABANALARGA - PONEDERA.**

Valor Inicial: 10.100 millones
Inversión adicional: 1.500 millones
Alcance: Se duplica capacidad de 200 a 400 lps
Familias beneficiadas: 18.650
Estado: En ejecución – Avance 22%

Este proyecto dará factibilidad técnica para el suministro de agua a los corregimientos de Sabanalarga (Patilla, gallego y Mirador).

➤ **CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO MANZANARES – MUNICIPIO DE BARANOA**

Valor: 505 millones
Alcance: 1280.13 m de Redes
Familias beneficiadas: 140
Estado: cuenta con diseños

➤ **LINEA DE CONDUCCION PATILLA – GALLEGO MIRADOR – MUNICIPIO DE SABANALARGA**

Valor: 3.500 millones
Alcance: Instalación de 13.5 km de Línea de conducción en 160mm
Familias beneficiadas: 250
Estado: En Ajuste y pendiente de viabilización. es Complementario con el proyecto de la ampliación de la PTAP de Sabanalarga

➤ **REHABILITACIÓN PTAR BOHORQUEZ – CAMPO DE LA CRUZ**

Valor: 300 millones
Objetivo: Rehabilitar PTAR
Familias beneficiadas: 125
Estado: En diseño.

➤ **OBRAS COMPLEMENTARIAS ALCANTARILLADO SANTARIO PITALITO - POLONUEVO**

Valor: 1.400 millones
Alcance: Construcción de EBAR y línea de Impulsión
Familias beneficiadas: 3.740
Estado: pendiente diseño.

➤ **REDES ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO CARRETO - CANDELARIA**

Valor: 1200 millones
Alcance: Pasar de 50% al 100% de cobertura en redes
Familias beneficiadas: 320
Estado: cuenta con diseño.

➤ **CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CANDELARIA – MUNICIPIO DE PONEDERA**

Valor: 795 millones
Alcance: Construcción de 2.900 ml tubería PVC de 8"y 32 Pozos de inspección
Familias beneficiadas: 68
Estado: Cuenta con diseño

➤ **REDES DE ACUEDUCTO BARRIO CIUDAD PARAISO ETAPA I - MUNICIPIO SOLEDAD**

Valor: 2.500 millones
Alcance: Instalación de Redes Aumentar cobertura
Familias beneficiadas: 1.200
Estado: Cuenta con diseño y se autorizó la presentación a la ventanilla regional.

➤ **CONSTRUCCIÓN TREDES DE ALCANTARILLADO BARRIO MEZOLANDIA – MUNICIPIO DE MALAMBO**

Valor Parcial: 1.316 millones
Alcance: Instalación Redes de alcantarillado, aumentar cobertura
Familias beneficiadas: 916
Estado: Pendiente diseño.

Una vez presentados los proyectos que hacen parte del PAEI 2019, fue sometido a consideración la aprobación del PAEI 2019, el cual fue aprobado por los miembros del comité directivo asistente, manifestando que el valor de los proyectos será ajustado al que resulte una vez viabilizado los mismos.


6- INFORME DEL FIA.

Acto seguido las Doctoras Nelcy Rivera Gerente del FIA y Neidy Patricia Pardo Directora PDA FIA, presentaron el informe del Patrimonio autónomo – FIA.

Recursos Administrados al 31 de Enero de 2019

RECURSOS RECIBIDOS P.A FIA	
FUENTE	DEPARTAMENTO
SGP	119,094
RECURSOS NACIÓN	40,617
OTROS RECURSOS	10,584
TOTAL RECURSOS POR FUENTE	170,295

Cifras en millones de pesos

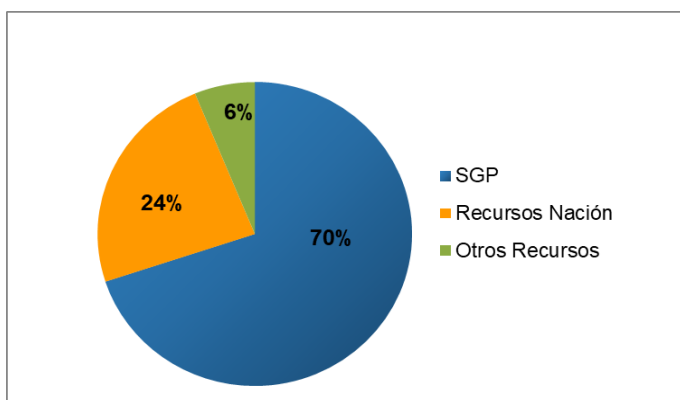


Disponibilidad al 31 de Enero de 2019

Cifras en millones de pesos

FUENTE	RECAUDO	RENDIMIENTOS	CDR'S EXPEDIDOS	DISPONIBILIDAD POR FUENTE
SGP	119,094	10,492	109,194	20,393
Recursos Nación	40,617	3,639	43,643	612
Otros Recursos	10,584	1,324	10,432	1,476
TOTAL	170,295	15,455	163,269	22,481

CDR's EXPEDIDOS Vs. PAGOS a 31 de Enero de 2019

RECAUDADO + RENDIMIENTOS	CDR EXPEDIDOS	CONTRATOS	PENDIENTE POR CONTRATAR	PAGOS	PENDIENTE POR PAGAR
185,750	163,269	161,736	1,532	130,317	31,419
	88%	99%	1%	81%	19%

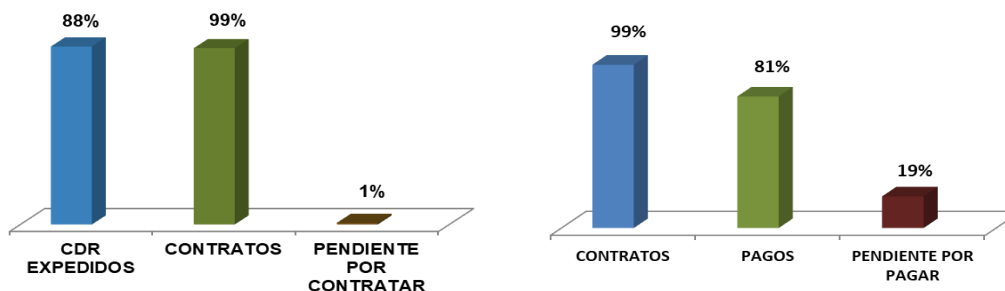

CDR's SIN CONTRATO ASOCIADO a 31 de Enero

A corte de Enero, se presentan 4 CDR's sin contrato asociado en el sistema del Consorcio FIA por un valor de \$2.759 millones, así

DANE	FIDEICOMITENTE	No. CDR	FECHA EXPEDICION	VALOR CDR POR FUENTE	DESCRIPCIÓN	FUENTE
8999	ATLANTICO	2865	21/06/2017	466.271.950,00	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS CUENCAS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE USIACURÍ. DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	SGP
8999	ATLANTICO	2869	21/06/2017	478.710.022,00	INTERVENTORÍA A LA AMPLIACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE SABANALARGA SECTOR 1 Y 2 ETAPA II-DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	SGP
8999	ATLANTICO	3521	23/08/2017	1.770.000.000,00	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO	SGP
8999	ATLANTICO	3823	27/09/2017	44.570.493,00	INTERVENTORÍA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SALGAR MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	SGP
				2.759.552.465,00		

Contratos con saldo que no presentan pagos a 31 de Enero de 2019

CONTRATISTA	SALDO CONTRATO PPTO	FECHA PAGO	OBJETO	NÚMERO CONTRATO FIA	NUMERO CDR
CONSORCIO ALFAREDES SALGAR	71.963.247,00	13/02/2017	CONTRATO 2133986 CONSTRUCCION DEL SISTEMA	CTO 2133986	60
UNION TEMPORAL REDES MALAMBO 2015	233.748,00	27/11/2017	3011*2011*000007//CONSTRUCCION DE SECTORES	3011*2011*000007	69
UNION TEMPORAL REDES MALAMBO 2015	32.790,00	27/11/2017	3011*2011*000007//CONSTRUCCION DE SECTORES	3011*2011*000007	75
SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL ATLANTICO	8.352.000,00	16/08/2017	3011-2016-000001/APOYO A LA GESTION COMITE T	3011-2016-000001	89
GNG INGENIERIA SAS	81.200,00	19/12/2016	3011*2015*00006 TIENE POR OBJETO INTERVENTO	3011*2015*00006	64
UNION TEMPORAL REDES MALAMBO 2015	1.391,00	27/11/2017	3011*2011*000007//ADICION//CONSTRUCCION DE	3011*2011*000007	96
CONSORCIO CND SOLEDAD 2010	37.379.539,00	17/11/2017	ADICION CTO 3011*2017*00004 // CONSTRUCCION	3011*2017*00004	68
CONSORCIO TUBARA 2015	68.618.683,00	18/12/2017	PAF-ATF-O-140-2015// CONSTRUCCION ESTACION	PAF-ATF-O-140-2015	2487
EDGAR URIBE Y CIA S.A.S-EUCO S.A.S.	1.272.538,00	20/12/2017	PAF-ATF-1057-2015// INTERVENTORIA TECNICA,AD	PAF-ATF-1057-2015	2488
PAMER INGENIERIA LIMITADA	7.374.263,00	11/07/2018	ADIC CONT 3011/2017 OBRAS COMPLEMENTARIAS	ADIC CONT 3011/2017	4645
	195.309.399,00				

GESTION – ACTUALIZACION SARLAFT 2019

De conformidad con lo establecido en el Contrato Fiduciario, dentro de los primeros meses del año 2019, es necesario se gestione con la Gobernación, la actualización de la siguiente documentación:

- Formulario de actualización de datos (Persona Jurídica= Ente Territorial y Persona Natural = Representante Legal del E.T.)
- Rut del Ente Territorial
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal del Ente T.
- Acta de Posesión
- Estados Financieros del Ente Territorial a Diciembre de 2018.
-

Para el trámite de los pagos, a partir de enero de 2019, se requiere la actualización de las formalidades de impuestos; así como la certificación de los municipios respecto a la obligación de reportar o no información exógena.

RENTABILIDAD P.A. FIA

Comparativo Rentabilidad (Rentabilidad EA 30 días)

Período: de Diciembre 2017 a Diciembre 2018

BENCHMARK - ENTIDADES BANCARIZADAS							BENCHMARK	RENTABILIDAD P.A F.I.A	IPC
MES	FIDUCIARIA DAVIVIENDA	FIDUCIARIA COLPATRIA	FIDUCIARIA POPULAR	FIDUCIARIA OCCIDENTE	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIAN A	PREVISORA ALTALIQUIDEZ			
dic 2017	4.30%	5.84%	5.67%	4.26%	5.50%	5.83%	5.24%	6.01%	4.09%
ene 2018	4.61%	4.87%	4.53%	4.78%	4.04%	4.87%	4.62%	5.78%	3.68%
feb 2018	4.60%	5.49%	5.32%	5.23%	5.12%	5.42%	5.20%	5.52%	3.37%
mar 2018	4.41%	5.23%	5.12%	4.90%	4.87%	5.14%	4.94%	5.32%	3.14%
abr 2018	4.63%	4.69%	4.86%	4.73%	4.73%	4.96%	4.77%	5.07%	3.13%
may 2018	4.46%	4.80%	4.66%	4.48%	4.47%	4.70%	4.59%	4.81%	3.16%
jun 2018	4.23%	4.61%	4.35%	4.28%	4.26%	4.49%	4.37%	4.60%	3.20%
jul 2018	4.05%	4.46%	4.36%	4.14%	4.04%	4.38%	4.24%	4.47%	3.12%
ago 2018	4.18%	4.43%	4.26%	4.49%	3.94%	4.38%	4.28%	4.44%	3.10%
sep 2018	4.12%	4.35%	4.08%	4.35%	3.82%	4.31%	4.17%	4.33%	3.23%
oct 2018	3.99%	4.14%	4.12%	3.94%	3.68%	4.17%	4.01%	4.21%	3.33%
nov 2018	3.84%	4.01%	3.94%	3.81%	3.55%	4.06%	3.87%	3.99%	3.27%
dic 2018	3.84%	3.85%	3.78%	3.68%	3.44%	3.95%	3.76%	3.85%	3.18%

7- PROPOSICIONES Y VARIOS.

El día 8 de febrero de 2019 se recibió del Departamento Nacional de Planeación las observaciones, las cuales están respondidas en las anotaciones antes descritas.

Siendo las 2:00 PM del 09 de Febrero de 2019 y agotado el orden del día se da por terminada la reunión.

Hace parte integral de esta acta la presentación entregada la cual se adjunta.

ORIGINAL FIRMADO
EDUARDO VERANO DE LA ROSA
Gobernador del Atlántico

ORIGINAL FIRMADO
LORETTA JIMENEZ SANCHEZ
Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico
